LAPORAN: Laporan Pemeriksaan Excavator Komatsu PC200

Nomor Dokumen	TMH-2026-008
Tanggal/Waktu	8 September 2026, 07:00 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Pemeriksaan
Status	Selesai
Petugas	Budi Santoso
Lokasi	Area Tambang Blok Selatan

Uraian

Pemeriksaan berkala excavator Komatsu PC200-8 yang beroperasi di area tambang blok selatan. Unit ini sudah mencapai 4.500 jam operasi dan mengalami penurunan performa hydraulik yang cukup signifikan dibandingkan kondisi normal standar pabrikan.

Pemeriksaan

Pengukuran tekanan hydraulic main pump menunjukkan 280 bar dari standar 320 bar. Pemeriksaan filter hydraulic menunjukkan partikel logam halus pada elemen filter. Suhu oli hydraulic mencapai 92 derajat celcius dari batas normal 80 derajat celcius.

Tindakan

Penggantian seluruh filter hydraulic termasuk pilot filter dan return filter. Penggantian oli hydraulic sebanyak 280 liter dengan oli Komatsu Ultra 10W. Pengecekan dan overhaul pump hydraulic unit untuk mengganti seal yang sudah aus dan ausir yang aus.

Hasil

Tekanan hydraulic kembali normal ke 320 bar setelah overhaul pump. Suhu oli hydraulic turun ke 74 derajat celcius dalam kondisi beban berat. Performa excavator untuk penggalian dan pengangkutan tanah kembali optimal sesuai spesifikasi pabrikan Komatsu.

Rekomendasi

Ganti oli hydraulic setiap 1.000 jam operasi dan filter hydraulic setiap 500 jam. Pantau suhu oli hydraulic secara real time melalui sensor yang sudah terpasang di panel operator. Sediakan stok seal kit overhaul pump untuk kebutuhan perbaikan darurat di lapangan.

Catatan

Excavator sudah dapat dioperasikan kembali untuk kegiatan penggalian di area tambang blok selatan. Dokumentasi foto kondisi filter bekas dan proses overhaul pump telah dilampirkan. Jadwal pemeriksaan berikutnya dijadwalkan pada akhir bulan November tahun ini.

Lampiran Foto

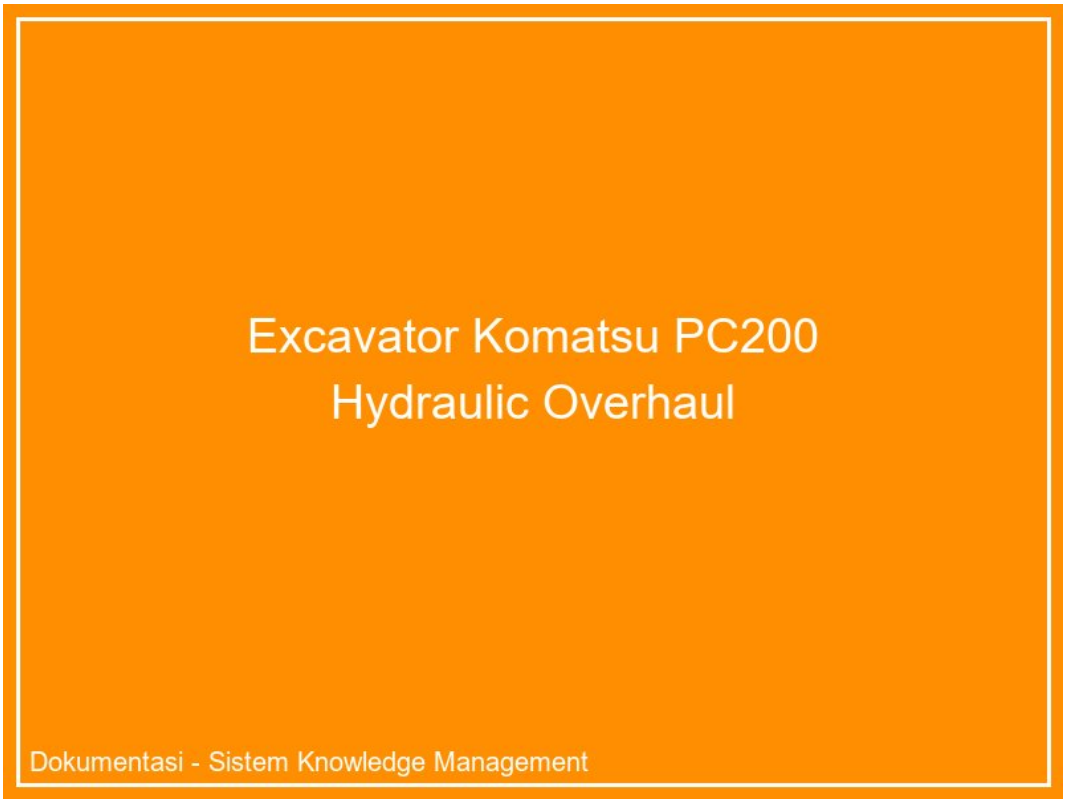

Foto 1: foto_tmh-2026-008.jpg
